Projet CNGS
Finitions

Suivi du 26.10.85
Reunions CNGS du 26.10.05
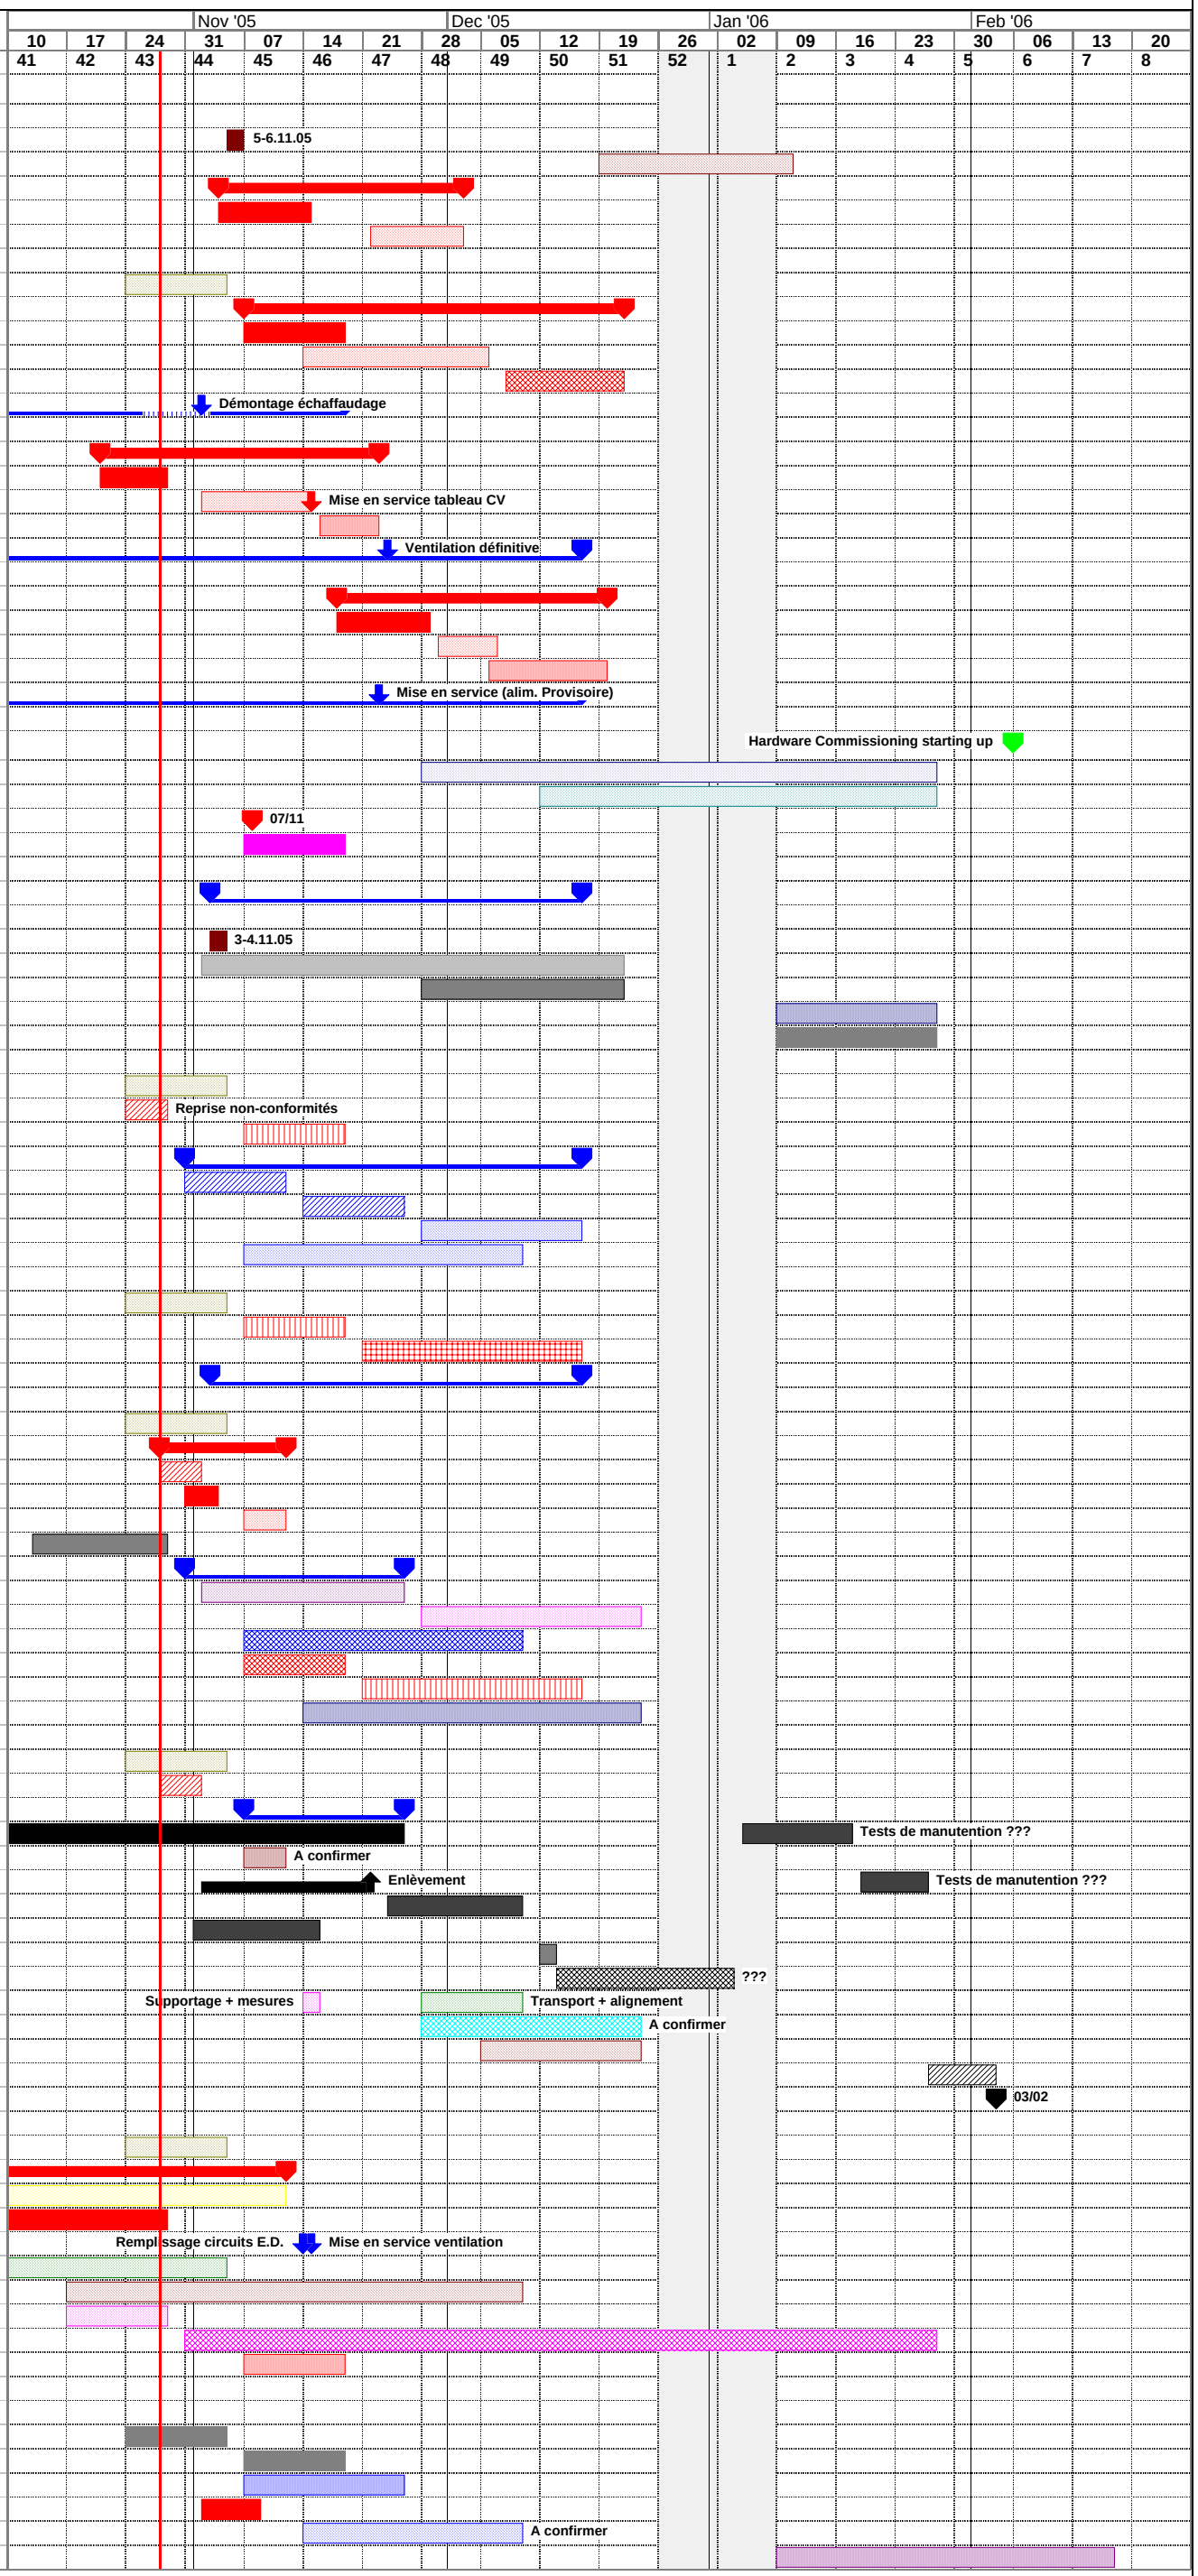
ID	Task Name
1	**SEMAINES**
27	**Surface**
28	**BHA4**
29	Radio-commande pont-roulant
30	Révision pont roulant (réducteur)
31	**Distribution électrique**
32	Chemins de câbles
33	Câblages
34	**BB4**
35	Nettoyage
36	**Distribution électrique**
37	Chemins de câbles
38	Câblages
39	Raccord convertisseurs
40	**Travaux TS-CV**
43	**SUI8**
44	**Distribution électrique**
45	Chemins de câbles
46	Câblages
49	Services généraux
50	**Travaux TS-CV**
53	**Batiment 930**
54	**Distribution électrique**
55	Chemins de câbles
56	Câblages
57	Services généraux
58	**Travaux TS-CV**
61	
62	**Souterrain**
63	**Installer les grilles et systèmes d'accès**
64	**Installer les portes**
65	Réception EL souterrain par SC
66	Téléphone rouge définitif
67	**PAP4**
68	Finitions Travaux TS-CV (calorifuge)
69	**ECA4/ECX4**
70	Radio-commande pont-roulant
71	Mur zone Kickers
72	Sas d'accès à TAG41
73	Equipements de radio-protection
74	Modification blindage ECX4
75	**TAG41/42**
76	Nettoyage
77	**Distribution électrique**
78	Alarmes évacuation
79	**Travaux TS-CV**
80	Tuyauterie rejet jonction en TJ8 (coupure radier)
81	Tuyauterie rejet jonction zone PGCN (coupure radier)
82	Finitions
83	Ventilation PGCN
84	**TCV4**
85	Nettoyage
86	Alarmes évacuation
87	Détection incendie
88	**Travaux TS-CV (finitions)**
89	**TSG4_**
90	Nettoyage
91	**Distribution électrique**
92	Reprise non-conformités
93	Chemins de câbles TSG45/47
94	48 volts TSG4
95	Tranchées pour tuyauteries écoulements eau de condensation
96	**Travaux TS-CV (finitions, station pompage, centrales ventil., ..)**
97	Installation des "strip line"
98	Installation 'alimentation (transfos) de la Corne + Réflecteur
99	Installation de stations de refroidissement de la Corne + Réflecteur
100	Alarmes évacuation
101	Détection incendie
102	Equipements radio-protection
103	**TCC4**
104	Nettoyage
105	**Distribution électrique, reprise non-conformités**
106	**Travaux TS-CV (finitions ventilation)**
107	**Cible T40**
110	Règle de repérage position pont-roulant
111	**Cornes**
114	**Réflecteur**
115	Installation "shutter"
116	Installation fenêtre sur le Decay Tube
117	Tests vide Decay Tube
118	Installation TBID
121	Installation et câblage sondes de température
122	Reprise non conformites pont roulant
123	Finitions blindage
124	Nettoyage final + peinture
125	**TT41**
126	Nettoyage
127	**Distribution électrique**
128	Exécution connecteurs
129	Installation coffrets F2 + câblage aval
130	**Travaux TS-CV**
133	Alignement des éléments de faisceau
134	Instalation des equipements vide
135	Installation des éléments de faisceau en TCC4 (QTL, QTS)
136	Raccordements des éléments magnétiques
137	Alarmes évacuation
138	
139	**Hadron Stop**
140	Modifications puisards TNM42 et TNB4
141	Finitions blindage TNM41
142	Installation stations de pompage TNM42 et TNB4
143	Distribution électrique, modifications TE/TZ80
144	Station de refroidissement TE80
145	Supports détecteurs
